แผนงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย ระยะทาง 2.811 กม.

ผู้ว่าจ้าง : สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้รับจ้าง : บริษัท ทิพากร จำกัด
มูลค่างาน : 675,968,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าปรับ (ต่อวัน) : 1,689,920.00 บาท

สัญญาจ้างเลขที่ : 31/2568 (ลว. 6 มิถุนายน 2568)
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 สิงหาคม 2568
วันสิ้นสุดสัญญา : 17 มกราคม 2571
ระยะเวลาก่อสร้าง : 900 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานตามสัญญา เงิน (บาท)	% งาน	ปี / เดือน	ปี 2568 ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ปี 2569 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ปี 2570 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ปี 2571 ม.ค.	%
ก	งานทาง																																		
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม																																		
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	1,645,350.00	0.243%	แผน									100.00																						
				ผล																															
	1.2. งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ศูนย์กลาง 1.00 เมตร)	134,500.00	0.020%	แผน									100.00																						
				ผล																															
	1.4 งานรื้อทางเท้าเดิม	20,000.00	0.003%	แผน									100.00																						
				ผล																															
2	งานดิน																																		
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	420,120.00	0.062%	แผน		5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00																			20.00	
				ผล	17.65																														
	2.2 งานตัดดินทาง	5,800,503.00	0.858%	แผน						5.04	7.56	12.04	14.29	14.29	11.77	9.25	7.00	4.76	4.76	2.24	2.24	1.19	1.19	1.19	1.19									-	
				ผล																															
	2.3 งานหินถมคันทาง	44,582,740.00	6.595%	แผน										7.72	11.58	11.58	11.58	11.58	7.72	3.88	3.88	3.88	3.88		6.27	6.27	5.38	2.27	0.84	0.84	0.84				
				ผล																															
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง																																		
	3.1 งานรองพื้นทาง	8,263,400.00	1.222%	แผน												10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00										
				ผล																															
	3.2 งานพื้นทาง	568,320.00	0.084%	แผน																						35.00	35.00	20.00	10.00						
				ผล																															
	3.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต	8,906,480.00	1.318%	แผน														10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00								
				ผล																															
4	งานผิวทาง																																		
	4.4 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	156,129,290.00	23.097%	แผน														3.58	3.58	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	10.73	10.73	7.15	0.01	0.96	7.12	7.12	7.11	6.16		
				ผล																															
ข	งานสะพานและท่อเหลี่ยม																																		
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)																																		
	5.1 งานสะพานคอนกรีต	176,359,422.00	26.090%	แผน					0.03	0.03	0.03	0.03		0.02	0.40	0.58	0.85	2.59	2.01	3.26	6.90	10.41	11.30	13.68	13.31	10.28	8.40	5.83	5.26	3.88	0.44	0.29	0.19		
				ผล																															
	5.1.2 งานเสาเข็มตอก	9,116,250.00	1.349%	แผน																25.00	25.00	25.00	25.00												
				ผล																															
	5.1.3 งานเสาเข็มเจาะขนาด ศูนย์กลาง 1.20 เมตร	37,256,688.00	5.512%	แผน						0.45	0.45	4.96	4.96	4.96	4.96	19.82	22.30	9.91	9.91	9.91	7.43														
				ผล																															
	5.1.4 งานทดสอบเสาเข็ม	3,444,510.00	0.510%	แผน								3.56			18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	0.74	0.22	0.22	0.22	0.22											
				ผล																															
	5.2 งานท่อลอดเหลี่ยม	2,087,483.00	0.309%	แผน					22.61	22.61	22.61	22.61							4.78	4.78															
				ผล																															
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)																																		
	6.1 งานกำแพงกันดิน	46,521,855.00	6.882%	แผน		1.15	5.92	8.88	11.26	11.26	16.91	13.16	10.90	9.87	7.49	3.18																			
				ผล																															
	6.2 ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS)	38,402,450.00	5.681%	แผน				6.59	3.83	3.83	16.07	16.07	18.30	11.27	15.73	4.37	3.93																		
				ผล																															
	6.3 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก(กำแพงปีก)	281,827.00	0.042%	แผน																							20.60	20.60	22.64	22.64	13.52				
				ผล																															
	6.4 บ่อพัก คสล.	14,485,827.00	2.143%	แผน																15.00	20.00	25.00	25.00	15.00											
				ผล																															
	6.5 งานคันหินและรางตื้น	8,218,440.00	1.216%	แผน																			20.00	25.00	25.00	25.00	5.00								
				ผล																															
	6.6 งานพื้นทางเท้า	35,725,120.00	5.285%	แผน																						20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
				ผล																															
	6.7 งานปลูกหญ้า	51,975.00	0.008%	แผน																													50.00	50.00	
				ผล																															
	6.8 งานป้ายจราจรและเครื่องอำนวยความปลอดภัย	17,979,836.00	2.660%	แผน																						3.74	3.74	3.84	2.77		11.29	22.74	26.83	25.03	
				ผล																															
	6.9 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์	24,963,614.00	3.693%	แผน																										23.93	23.93	20.86	20.43	10.86	
				ผล																															
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง																																		
	7.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	5,000,000.00	0.740%	แผน	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	
				ผล																															
	7.2 งานมาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย	2,300,000.00	0.340%	แผน	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	
				ผล																															
ค	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด																																		
8	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น																																		
	8.1 งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม	23,602,000.00	3.492%	แผน			30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
				ผล	25.83																														
	8.3 งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	3,700,000.00	0.547%	แผน			30.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
				ผล																															
	รวมค่างาน (ทั้งหมด)	675,968,000.00	100.000%																																

วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 สิงหาคม 2568

วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 มกราคม 2571

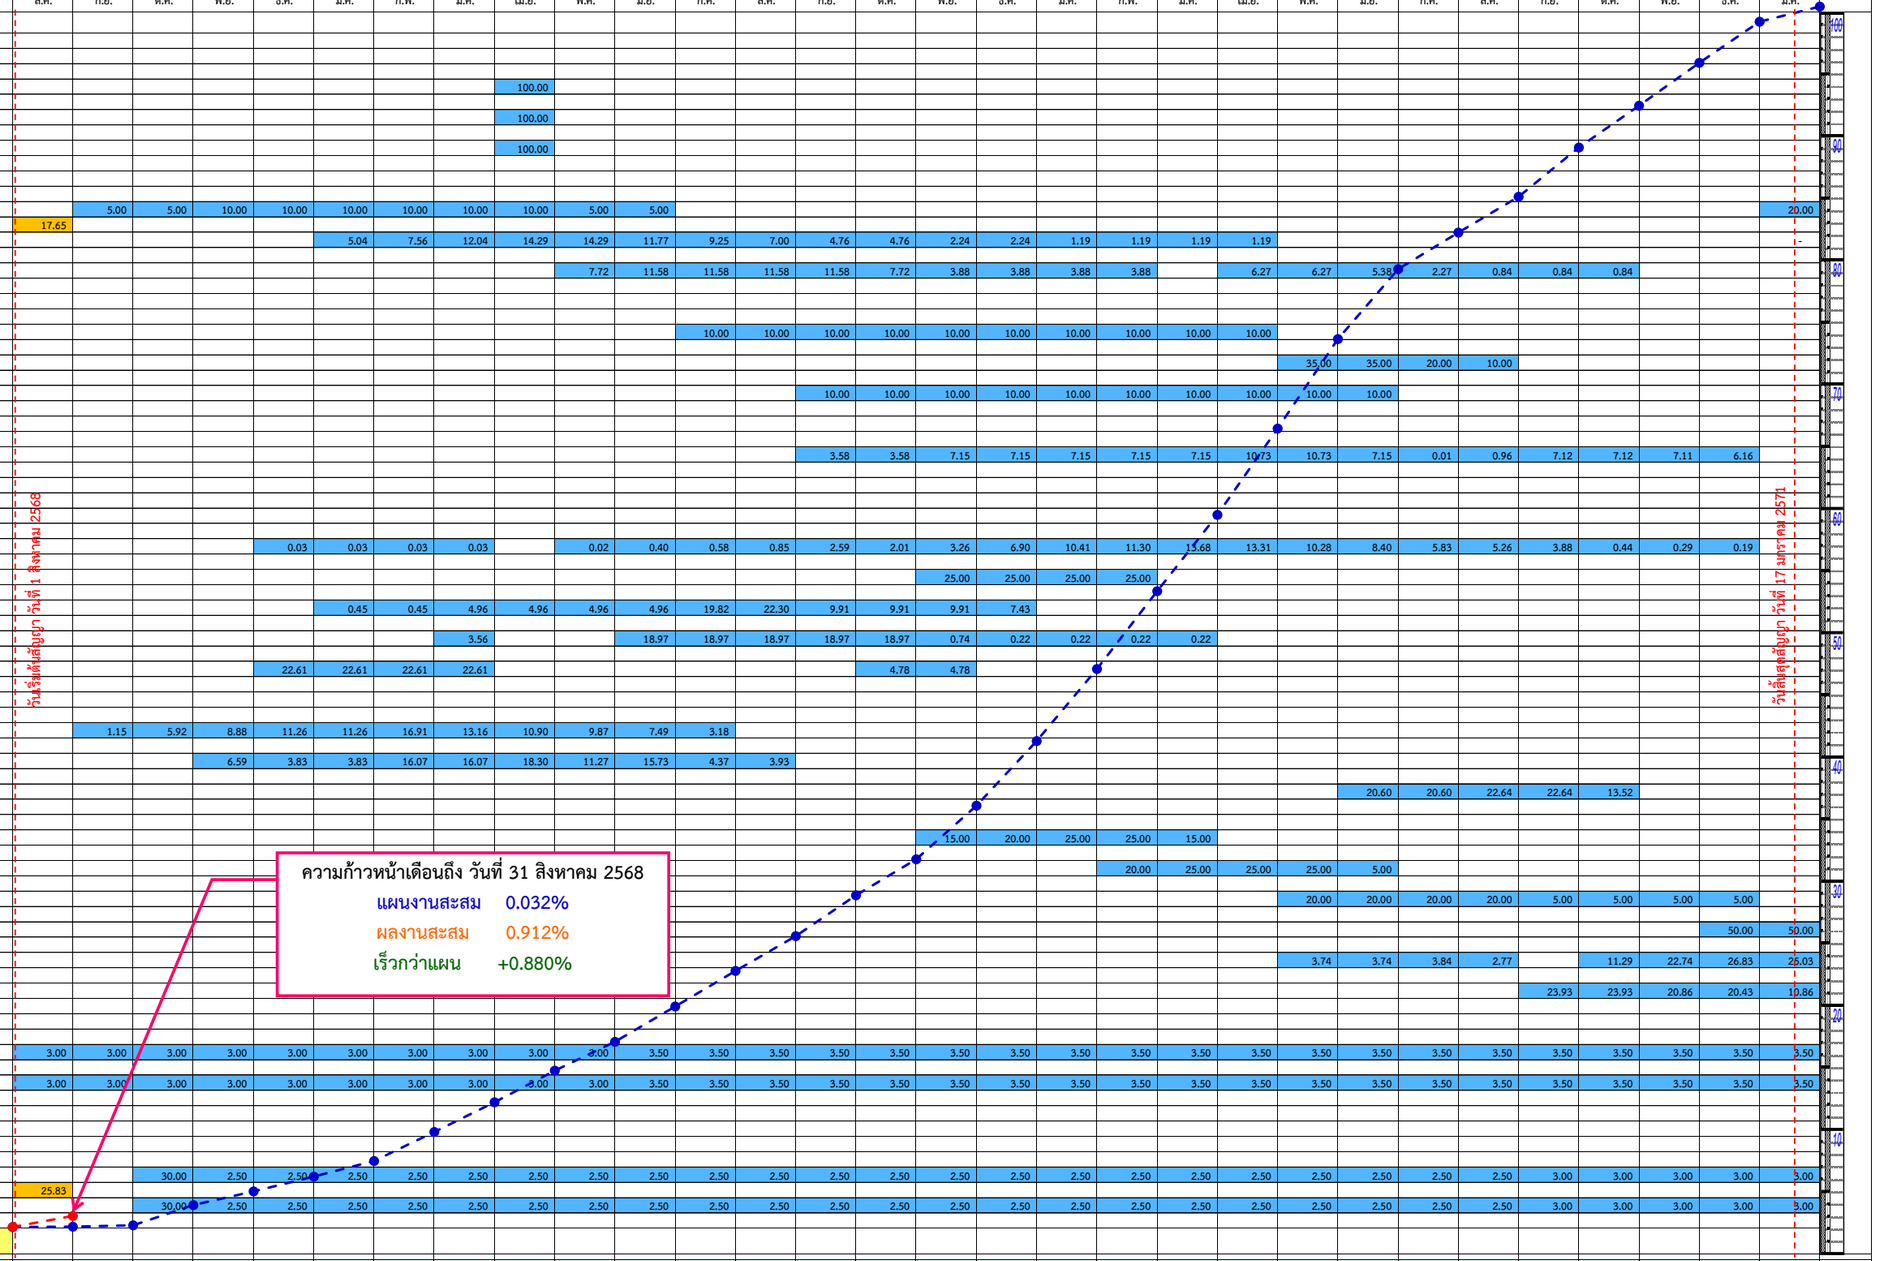

แผนงานก่อสร้าง	แผนงาน (เปอร์เซ็นต์)	0.032	0.115	1.655	1.125	1.209	1.277	2.383	2.429	2.592	2.368	2.889	2.912	2.856	3.341	2.952	4.394	5.295	5.901	6.375	6.251	7.071	7.334	5.726	2.997	2.938	4.029	3.427	3.516	3.367	1.242
	แผนงานสะสม (เปอร์เซ็นต์)	0.032	0.147	1.802	2.927	4.137	5.414	7.796	10.226	12.817	15.185	18.075	20.986	23.842	27.183	30.135	34.529	39.825	45.726	52.101	58.353	65.424	72.758	78.484	81.481	84.419	88.448	91.875	95.391	98.758	100.000
	แผนงาน (ล้านบาท)	0.219	0.776	11.185	7.607	8.174	8.633	16.107	16.422	17.519	16.005	19.531	19.682	19.304	22.585	19.953	29.704	35.796	39.891	43.096	42.258	47.799	49.578	38.705	20.259	19.858	27.237	23.165	23.765	22.760	8.395
	แผนงานสะสม (ล้านบาท)	0.219	0.995	12.180	19.787	27.961	36.595	52.701	69.123	86.642	102.647	122.178	141.860	161.164	183.749	203.702	233.406	269.202	309.093	352.189	394.447	442.246	491.823	530.529	550.787	570.645	597.883	621.047	644.813	667.573	675.968
ผลงานก่อสร้าง	ผลงาน (เปอร์เซ็นต์)	0.912																													
	ผลงานสะสม (เปอร์เซ็นต์)	0.912																													
	ผลงาน (ล้านบาท)	6.170																													
	ผลงานสะสม (ล้านบาท)	6.170																													
ผลต่าง	(เปอร์เซ็นต์)	0.880																													
